

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक


27.02.2024 को

सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

की छियालीसवीं बैठक का

कार्यवृत्त

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमतीनगर
लखनऊ-226010

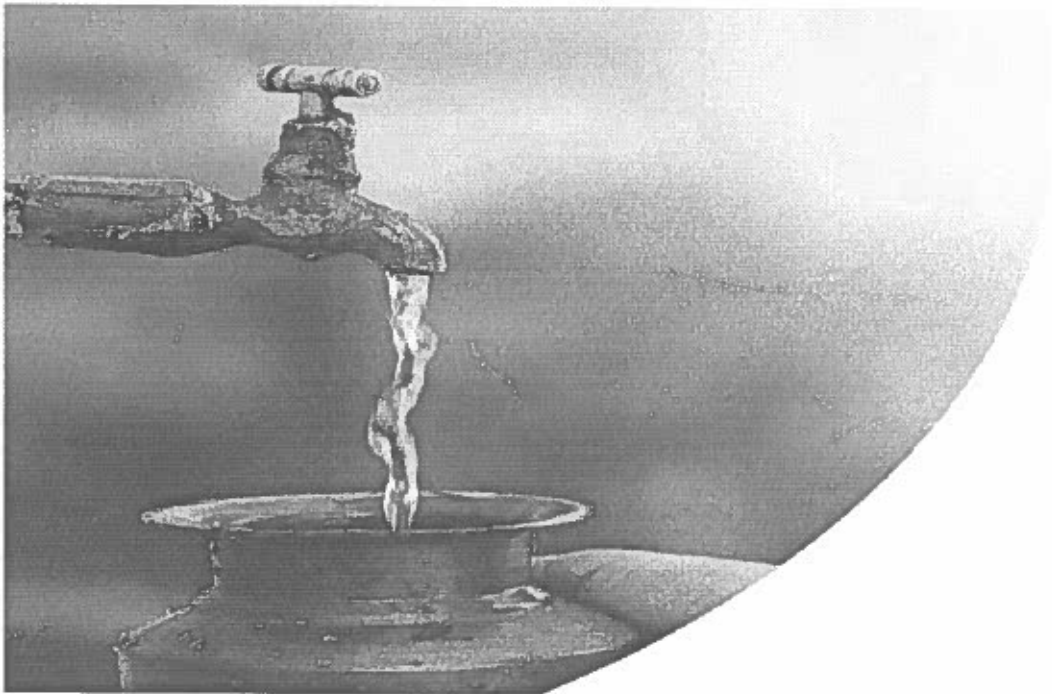

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2024 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की छियालीसवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:— संलग्न सूची के अनुसार।

बिन्दु संख्या—01

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 06.12.2023 को सम्पन्न पैतालीसवीं बैठक के अनुपालन आख्या का मा० समिति द्वारा संज्ञान लेते हुये निम्न निर्देश दिये गये:—

1. जिन ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है उन योजनाओं के समस्त कार्य समयावधि के अन्तर्गत अवश्य पूर्ण कर लिये जाएं।
2. जिन ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जा चुकी है उनमें से जिन ग्रामों में अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, उन ग्रामों का अनुबंध अतिशीघ्र कराते हुये उन पर कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएं।



No. W-11016/11/2021-JJM.IV-DDWS(Pt.-3)
भारत सरकार /Government of India
जल शक्ति मंत्रालय /Ministry of Jal Shakti
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग /Department of Drinking Water and Sanitation
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन /National Jal Jeevan Mission

'Antyodaya' Bhavan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003
Dated: 01 March, 2024

To,

The Principal Secretary,
Namami Gange & Rural Water Supply Department,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow, UP.


Subject: Meeting of 46th SLSSC, UP to be held on 27th Feb, 2024 – Comments regarding.

Sir,

Kindly refer to the meeting notice for 46th SLSSC meeting shared with this department vide letter No. 5020/W-335/Tech/JJM/SLSSC-46th/2023-24 dated 23rd Feb, 2024.

2. In this regard, I am directed to inform that the agenda enclosed with the aforesaid reference has been examined and the observations of this department on the same are enclosed at **Annex**. It is requested to finalize the MoM of 46th SLSSC after considering the enclosed observations.

Yours faithfully,


(Manoj Kumar Jha)

Under Secretary to Government of India
e-mail: manojkumar.jha@nic.in

Observations of NJJM, DDWS on the Agenda Note of 46th SLSSC meeting of Uttar Pradesh to be held on 27th Feb. 2024

Agenda No.1 :

The agenda proposes revision in 50 nos. surface water-based schemes under JJM, covering 9 districts (7 of Bundelkhand & 2 of Vindhya region). These schemes were approved on 01.07.2020 under JJM. The cost of these schemes at the time of approval was Rs.11,072.77 Crores. The revised proposed cost is Rs. 12,052.79 Crores.

To understand the reasons for revision in cost of these schemes, the matter has been discussed with UP SWSM officials. These 50 schemes were now converged to 45 schemes due to reason on account of source sustainability leading to increase in distribution network apart from effect of GST/Power/NOC. The break-up is as below:

Particulars	Amount (in Crores)	Reasons cited by the State
Approved cost	11,072.77	
Change on account of Scope of Work	220.52	Due to change in alignment of pipeline, location of source, addition & subtraction of villages etc.
Change on account of GST	535.16	Change in GST rates over the years since the approval of schemes on 01.07.2020
Change on account of Power / NOC	224.37	Changes in charges claimed by agencies for power connections, railway crossings etc
Total Revised cost	12,052.79	
Additional cost	980.02	

Comments of NJJM:

1. The change in estimated cost of the schemes on account of scope of work may be met from the resources of State Government outside JJM.
2. The cost revision on account of change in GST, Statutory & mandatory requirements may be considered.

Agenda No.2:

The agenda proposes revision in 98 nos. ground water-based schemes under JJM in Mirzapur district. These schemes were approved on 01.07.2020 under JJM. The cost of these schemes at the time of approval was Rs.214.77 Crores. The revised proposed cost is Rs.248.42 Crores.

The reason for variation in cost is attributed due to change in scope of work/GST/Power/NOC. The break-up is as below:

Particulars	Amount (in Crores)	Reasons cited by the State
Approved cost	214.77	
Change on account of Scope of Work	17.93	Due to change in alignment of pipeline, location of source, addition & subtraction of villages etc.
Change on account of GST	11.26	Change in GST rates over the years since the approval of schemes on 01.07.2020
Change on account of Power / NOC	4.46	Changes in charges claimed by agencies for power connections, railway crossings etc
Revised cost	248.42	
Additional cost	33.65	

Comments of NJJM:

1. The change in estimated cost of the schemes on account of scope of work may be met from the resources of State Government outside JJM.
2. The cost revision on account of change in GST, Statutory & mandatory requirements may be considered.

एजेण्डा बिन्दु संख्या-1

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र के 09 जनपदों हेतु पूर्व में स्वीकृत 50 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं (स्वीकृत लागत रु0 11072.77 करोड़) को 45 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में समाहित करने तथा कार्यों के स्कोप इत्यादि में वृद्धि/कमी के फलस्वरूप पुनरीक्षित अनुमानित लागत रु0 12072.56 करोड़ का प्रस्ताव।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 जनपदों, कुल 09 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु महत्वाकांक्षी योजना को मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24.07.2018 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र के 09 जनपदों हेतु कुल 612 योजनायें (68 सतही स्रोत आधारित एवं 544 भूजल आधारित) जिनका अनुमानित लागत रु0 15310.57 करोड़ है, का विरचन कराया गया। दिनांक 15.08.2019 को जल जीवन मिशन प्रारम्भ किये जाने के फलस्वरूप नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 979/छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 26.05.2020 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विन्ध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं को भी जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आच्छादित करते हुए अग्रिम क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त के क्रम में बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 612 योजनाओं, अनुमानित लागत रु0 15310.57 करोड़ का प्रस्ताव मा0 राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 01.07.2020 को प्रस्तुत किया गया। मा0 समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजनाओं को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किया गया। उपरोक्त योजनाओं हेतु ई-टेन्डर के माध्यम से फर्मों का चयन करते हुये अनुबंध का गठन किया गया है।

वर्तमान में उपरोक्त योजनाओं में से 50 योजनाओं जिनकी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 01.07.2020 के अनुसार स्वीकृत लागत रु0 11072.77 करोड़ है, के कार्यों को 45 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में समाहित करते हुए कार्य कराया जा रहा है। इन योजनाओं में कार्य के स्कोप में परिवर्तन, जी0एस0टी0 के दर में वृद्धि, पावर कनेक्शन की लागत में वृद्धि तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुये व्यय के कारण योजनाओं की लागत में कमी/वृद्धि हुई है। मा0 राज्य स्तरीय वित्त व्यय समिति उ0प्र0, द्वारा उक्त योजनाओं की पुनरीक्षित लागत रु0 12072.56 करोड़ (संलग्न सूची के अनुसार) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव -एजेण्डा के साथ संलग्न 50 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के स्थान पर 45 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं जिनकी पुनरीक्षित अनुमानित लागत रु0 12072.56 करोड़ है, की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तुत एजेण्डा पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के पत्र संख्या W-11016/11/2021-JJM-IV-DDWS(Pt-3) dated 01-03-2024 द्वारा प्राप्त Observations पर आख्या निम्नवत् है :-

Sr. No	Observations from NJJM	Reply on observations
1.	<u>Agenda No-1 & 2</u> The change in estimated cost of the schemes on account of scope of work may be met	बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत कुल 68 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में से दिनांक 06.12.2023 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 45वीं

from the resources of State Government outside JJM.

बैठक में मा0 समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत 18 सतही स्रोत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की कुल कार्य लागत रु0 3278.73 करोड़ के सापेक्ष पुनरीक्षित योजनाओं की लागत में कार्य के स्कोप में वृद्धि, जीएसटी में वृद्धि, एनओसी/पावर कनेक्शन इत्यादि में कमी/वृद्धि के फलस्वरूप कुल रु0 399.20 करोड़ की वृद्धि के साथ रु0 3677.92 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

दिनांक 06.12.2023 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 45वीं बैठक में मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत 18 सतही स्रोत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में मूल रूप में कुल 1339 राजस्व ग्राम एवं 3,78,444 हाउसहोल्ड सम्मिलित थे। संशोधित योजनाओं में कुल 1446 राजस्व ग्राम 3,86,611 हाउसहोल्ड सम्मिलित हैं। उपरोक्त योजनाओं की लागत में वृद्धि का मुख्य कारण कार्य के स्कोप में वृद्धि (यथा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वृद्धि, राइजिंग मेन में वृद्धि, ग्रामों/मजराओं की संख्या में वृद्धि, तकनीकी दृष्टिकोण से योजनाओं को Re-organise करने के कारण OHT/CWR की संख्या/क्षमता में परिवर्तन इत्यादि), GST की दर में वृद्धि, विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हुए व्यय तथा पावर कनेक्शन में हुए व्यय के कारण हुई है। किसी भी योजना में Price Escalation इत्यादि के कारण लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। उक्त कारणों से योजनाओं की लागत में हुयी वृद्धि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अनुमन्य है।

दिनांक 27.02.2024 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 46वीं बैठक में एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 पर मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत 50 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं को 45 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में समाहित किया गया है। जिसमें से 11 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की संशोधित कार्य लागत में रु0 -577.45 करोड़ की कमी आयी है तथा 39 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की संशोधित कार्य लागत में रु0 1577.24 करोड़ की वृद्धि हुयी है। इस प्रकार पूर्व में स्वीकृत कार्य लागत रु0 11072.77 करोड़ की 50 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं को 45 योजनाओं में समाहित किया गया है। इन योजनाओं की पुनरीक्षित लागत में कमी/वृद्धि के फलस्वरूप रु0 999.79 करोड़ की वृद्धि के साथ अनुमानित लागत रु0 12072.56 करोड़ हुई है। उपरोक्त सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में पूर्व में कुल 4098 राजस्व ग्राम सम्मिलित थे। संशोधित योजनाओं में कुल 4404 राजस्व ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। उपरोक्त योजनाओं की लागत में वृद्धि का मुख्य कारण कार्य के स्कोप में वृद्धि (यथा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वृद्धि, राइजिंग मेन में वृद्धि, ग्रामों/मजराओं की संख्या में वृद्धि, तकनीकी दृष्टिकोण से योजनाओं को Re-organise करने के कारण OHT/CWR की संख्या/क्षमता में परिवर्तन इत्यादि), GST

18-6-

7

4

		की दर में वृद्धि, विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हुए व्यय तथा पावर कनेक्शन में हुए व्यय के कारण हुई है। किसी भी योजना में Price Escalation इत्यादि के कारण लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। उक्त कारणों से योजनाओं की लागत में हुयी वृद्धि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अनुमन्य है। इस प्रकार बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र हेतु स्वीकृत कुल 68 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप योजनाओं में से दिनांक 06.12.2023 को मा10 समिति द्वारा अनुमोदित 18 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं एवं दिनांक 27.02.2024 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में मा10 समिति के समक्ष प्रस्तुत 50 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं को 45 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में समाहित किये जाने के उपरान्त कुल 63 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं जिनकी पूर्व में स्वीकृत कुल अनुमानित लागत रु0 14351.50 करोड़ में कमी/वृद्धि के फलस्वरूप रु0 1398.99 करोड़ की वृद्धि के साथ पुनरीक्षित अनुमानित लागत रु0 15750.48 करोड़ है। बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र की समस्त सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की अनुमानित लागत में रु0 1398.99 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसमें कार्य लागत में वृद्धि रु0 395.32 करोड़, जीएसटी में वृद्धि रु0 736.20 करोड़ तथा एनओसी/पावर कनेक्शन में वृद्धि रु0 267.47 करोड़ है। एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 के रूप में प्रस्तुत जनपद-मिर्जापुर की 98 भूजल आधारित योजनाओं की मूल अनुमानित लागत रु0 214.77 करोड़ के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमानित लागत रु0 248.42 करोड़ का प्रस्ताव है। इस प्रकार इन योजनाओं में कुल 33.65 करोड़ की वृद्धि हुई है जिसमें कार्य लागत में वृद्धि रु0 17.93 करोड़, जीएसटी में वृद्धि रु0 11.26 करोड़ तथा एनओसी/पावर कनेक्शन में वृद्धि रु0 4.46 करोड़ है। इस प्रकार जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के लिये राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत समस्त योजनाओं की कुल अनुमानित लागत रु0 153278.00 करोड़ के सापेक्ष कार्य के स्कोप में वृद्धि के कारण कार्य लागत में मात्र रु0 413.25 करोड़ की वृद्धि हुयी है जो कुल अनुमानित लागत का 0.27 प्रतिशत है। यह भी अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्रों हेतु स्वीकृत योजनाओं की कार्य लागत में योजनावार कतिपय परिवर्तन होने की संभावना के बावजूद जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं की सम्मिलित अनुमानित लागत में वृद्धि होने की संभावना नगण्य है।
2.	The cost revision on account of change in GST, Statutory & mandatory requirements may be considered.	जी0एस0टी0, अनापत्ति प्राप्त करने/पावर कनेक्शन के मद में हुयी वृद्धि को उक्त मदों में ही व्यय किया जायेगा।

8 - 7 -

Sup

4

निर्णय- एजेण्डा के साथ संलग्न 50 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के स्थान पर 45 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं जिनकी मा0 समिति द्वारा स्वीकृत मूल अनुमानित लागत रू0 11072.77 करोड़ तथा पुनरीक्षित अनुमानित लागत रू0 12072.56 करोड़ है, के प्रस्ताव पर मा0 समिति संज्ञानित हुई कि उपरोक्त योजनाओं की अनुमानित लागत में वृद्धि रू0 999.79 करोड़ का मुख्य कारण कार्य के स्कोप में वृद्धि (यथा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वृद्धि, राइजिंग मेन में वृद्धि, ग्रामों/मजराओं की संख्या में वृद्धि, तकनीकी दृष्टिकोण से योजनाओं को Re-organise करने के कारण OHT/CWR की संख्या/क्षमता में परिवर्तन इत्यादि), GST की दर में वृद्धि, विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हुए व्यय तथा पावर कनेक्शन में हुए व्यय के कारण हुई है। किसी भी योजना में Price Escalation, inadmissible cost इत्यादि के कारण लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। उक्त प्रस्ताव पर मा0 समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

18

18

18

List of 50/45 Surface Water Supply Schemes (Revised Cost)

S. No.	District	Name of Scheme	Approved SLSSC Cost (Rs. In Cr.)	Proposed Revised Cost (Rs. In Cr.) (Approved by EFC)	Variation (Rs in Cr.)			
					Work Cost	GST	Power & NOC	Total Cost
					Amt	Amt	Amt	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+7+8)
1	Jhansi	Gulara GOV Water Supply Scheme	261.42	311.97	17.25	13.33	19.97	50.55
2	Jhansi	Bacholi Bauzurg GOV Water Supply Scheme						
3	Jhansi	Tiaetha GOV Water Supply Scheme						
4	Jhansi	Imlota GOV Water Supply Scheme	224.86	297.30	49.13	18.63	4.68	72.44
5	Jhansi	Teharkha GOV Water Supply Scheme	460.37	591.66	81.40	39.85	10.04	131.29
6	Jhansi	Barthari GOV Water Supply Scheme						
7	Jhansi	Purwa GOV Water Supply Scheme						
8	Jhansi	Barwar GOV Water Supply Scheme	118.51	146.45	15.32	8.98	3.64	27.94
9	Jhansi	Kuraicha GOV Water Supply Scheme	228.89	281.80	27.84	15.97	9.09	52.91
10	Lalitpur	Gona Narhat GOV piped WSS	247.53	274.70	5.78	12.51	8.88	27.17
11	Lalitpur	SAIDPUR KUMHERI GOV PIPED WSS						
12	Lalitpur	MASORA SINDWAHA GOV PIPED WSS	147.92	166.81	3.43	6.43	9.03	18.89
13	Lalitpur	LAGAON GOV PIPED WSS	140.67	176.08	12.37	7.34	15.70	35.41
14	Lalitpur	KACHNODA KALAN GOV PIPED WSS	188.80	245.98	30.75	13.64	12.79	57.18
15	Lalitpur	DHAURA BALABEHAT GOV PIPED WSS	411.23	504.00	32.16	29.16	31.45	92.77
16	Lalitpur	JAKHLON BIRDHA GOV PIPED WSS						
17	Lalitpur	KADESRA KALAN GOV PIPED WSS						
18	Lalitpur	MAU GOV PIPED WSS						
19	Lalitpur	SOJANA GURGHA GOV PIPED WSS	92.81	95.28	-4.90	3.24	4.13	2.47
20	Banda	Khatan Group of Village water supply Scheme	1598.34	1563.14	-61.43	65.26	-39.03	-35.20
21	Chitrakoot	Raipura Group Of Village water supply scheme	240.25	303.32	43.52	18.73	0.82	63.07
22	Chitrakoot	Silauta Mustakil Group Of Village water supply scheme	976.07	1173.34	117.61	76.22	3.44	197.27
23	Chitrakoot	Chandi Bangar Group Of Village water supply scheme						
24	Chitrakoot	Bhartaul group of village water supply scheme	97.92	0.00	-86.07	-9.14	-2.71	-97.92
25	Mahoba	SHIVHAR GOV PIPED WSS	241.72	271.18	10.40	12.60	6.46	29.46
26	Mahoba	SALAIYA KHALSA-NATHUPURA GOV PIPED WSS	251.40	260.09	-11.93	6.58	14.04	8.69
27	Mahoba	LACHOORA KASHIPURA GOV PIPED WSS	204.35	236.02	12.97	11.16	7.54	31.67
28	Mahoba	DHAWARRA SIJWAHA GOV PIPED WSS	347.31	333.01	-34.11	9.77	10.04	-14.30
29	Mahoba	KABRAI GOV PIPED WSS	134.20	157.87	12.35	8.81	2.51	23.67
30	Hamirpur	Haraulipur Group of Village water supply Scheme	94.05	81.60	-17.28	1.94	2.89	-12.45
31	Hamirpur	Patyora Danda Group of Village water supply Scheme	443.84	398.78	-54.83	12.55	-2.78	-45.06
32	Jalaun	SALA GOV PIPED WSS	565.27	505.99	-72.84	18.03	-4.47	-59.28

B 20 - 9 - Sep

S. No.	District	Name of Scheme	Approved SLSSC Cost (Rs. In Cr.)	Proposed Revised Cost (Rs. In Cr.) (Approved by EFC)	Variation (Rs in Cr.)			
					Work Cost	GST	Power & NOC	Total Cost
					Amt	Amt	Amt	Amt
33	Jalaun	KOTA MUSHTAKIL GOV PIPED WSS	385.51	475.11	58.74	32.36	-1.50	89.60
34	Jalaun	RAIPUR GOV PIPED WSS						
35	Jalaun	MADHEPURA GOV PIPED WSS						
Total :- (Bundelkhand)			8192.05	8948.52	189.51	437.99	128.96	756.47
36	Mirzapur	Mahurari GOV Water Supply Scheme	54.74	65.63	8.33	3.04	-0.48	10.89
37	Mirzapur	Leduki GOV Water Supply Scheme	225.32	269.01	25.69	12.49	5.51	43.69
38	Sonbhadra	Belahai Group of Vilages	203.41	231.45	10.00	10.90	7.14	28.04
39	Sonbhadra	Nagawan Group of Villages	189.63	223.30	8.63	10.59	14.49	33.67
40	Sonbhadra	Tenduahi Group of Villages						
41	Sonbhadra	Jhilo Group of Villages	599.94	747.94	77.55	36.41	34.04	148.00
42	Sonbhadra	Bijpur Group of Villages	26.75	0.00	-23.25	-2.76	-0.74	-26.75
43	Sonbhadra	Parasi Group of Villages	130.21	263.48	106.17	24.66	2.44	133.27
44	Sonbhadra	Belawadh Group of Villages	128.83	0.00	-112.68	-13.39	-2.76	-128.83
45	Sonbhadra	Patwadh 2 Group of Villages	841.78	991.81	74.13	53.23	22.67	150.03
46	Sonbhadra	Patwadh Group of Villages	113.87	0.00	-101.67	-12.20	0.00	-113.87
47	Sonbhadra	Harra Group of Villages	215.46	212.02	-24.55	8.50	12.61	-3.44
48	Sonbhadra	Kadara Group of Villages						
49	Sonbhadra	Newari Group of Viliges	40.35	0.00	-36.03	-4.32	0.00	-40.35
50	Sonbhadra	Kewatha Group of Vilages	110.43	119.40	1.76	6.72	0.49	8.97
Total :- (Vindhya Region)			2880.72	3124.04	14.08	133.87	95.41	243.32
GRAND TOTAL			11072.77	12072.56	203.59	571.86	224.37	999.79

12

14

17

18

एजेण्डा बिन्दु संख्या-2

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र के जनपद मिर्जापुर के 98 भू-जल आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं (स्वीकृत लागत रु० 214.77 करोड़) के पुनरीक्षित अनुमानित लागत रु० 248.42 करोड़ का प्रस्ताव।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 जनपदों, कुल 09 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु महत्वाकांक्षी योजना मा० मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24.07.2018 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र के 09 जनपदों हेतु कुल 612 योजनायें (68 सतही स्रोत आधारित एवं 544 भू-जल आधारित) जिनका अनुमानित लागत रु० 15310.57 करोड़ है, का विरचन कराया गया। दिनांक 15.08.2019 को जल जीवन मिशन प्रारम्भ किये जाने के फलस्वरूप नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या 979/छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 26.05.2020 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विन्ध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं को भी जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आच्छादित करते हुए अग्रिम क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त के कम में बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 612 योजनाओं, अनुमानित लागत रु० 15310.57 करोड़ का प्रस्ताव मा० राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 01.07.2020 को प्रस्तुत किया गया। मा० समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त योजनाओं को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किया गया। उपरोक्त योजनाओं हेतु ई-टेन्डर के माध्यम से फर्मों का चयन करते हुये अनुबंध का गठन किया गया है।

वर्तमान में उपरोक्त योजनाओं में से जनपद मिर्जापुर की 98 भू-जल आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं जिनकी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 01.07.2020 के अनुसार स्वीकृत लागत रु० 214.77 करोड़ है, में कार्य के स्कोप में परिवर्तन, जी०एस०टी० के दर में वृद्धि, पावर कनेक्शन की लागत में वृद्धि तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुये व्यय के कारण योजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है।

प्रस्ताव -एजेण्डा के साथ संलग्न जनपद मिर्जापुर की 98 भू-जल आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनायें जिनकी पुनरीक्षित अनुमानित लागत रु० 248.42 करोड़ है, की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- एजेण्डा के साथ संलग्न जनपद मिर्जापुर की 98 भू-जल आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनायें, जिनकी मूल लागत रु० 214.77 करोड़ है तथा पुनरीक्षित अनुमानित लागत रु० 248.42 करोड़ है, के प्रस्ताव पर मा० समिति संज्ञानित हुई कि उपरोक्त योजनाओं की लागत में वृद्धि रु० 33.65 करोड़ का मुख्य कारण कार्य के स्कोप में वृद्धि (यथा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वृद्धि, ग्रामों/मजराओं की संख्या में वृद्धि, तकनीकी दृष्टिकोण से योजनाओं को Re-organise करने के कारण OHT की संख्या/क्षमता में परिवर्तन इत्यादि), GST की दर में वृद्धि, विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हुए व्यय तथा पावर कनेक्शन में हुए व्यय के कारण हुई है। किसी भी योजना में Price Escalation, inadmissible cost इत्यादि के कारण लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। उक्त प्रस्ताव पर मा० समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

B — 11 — ④

[Signature] [Signature]

List of 98 Ground Water Supply Schemes (Revised Cost)

Sr. No.	District	Scheme Name	Approved SLSSC Cost (Rs. In Cr.)	Proposed Revised Cost (Rs. In Cr.)	Variation due to increase (in Cr.)			
					Work Cost	GST	Power/N OC	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+7+8)
1	Mirzapur	Aghauli	1.6233	2.0928	0.3256	0.1102	0.0337	0.4695
2	Mirzapur	Aghwar	2.1393	2.5233	0.1661	0.1091	0.1088	0.3840
3	Mirzapur	Anantram_Patti	1.4766	2.1469	0.5096	0.1354	0.0253	0.6703
4	Mirzapur	Arjunpur	2.6960	2.8549	0.0100	0.1107	0.0382	0.1589
5	Mirzapur	Badhwa	2.1187	2.6234	0.3397	0.1392	0.0258	0.5047
6	Mirzapur	Bagha	2.4589	1.7044	-0.7427	-0.0375	0.0257	-0.7545
7	Mirzapur	Baliparwa	1.9920	2.3444	0.2116	0.1094	0.0314	0.3524
8	Mirzapur	Barani	3.8137	3.4451	-0.4872	0.0812	0.0374	-0.3686
9	Mirzapur	Barji Mukundpur	1.5225	2.1219	0.4295	0.1235	0.0464	0.5994
10	Mirzapur	Basaratpur	3.3066	3.7000	0.1823	0.1745	0.0366	0.3934
11	Mirzapur	Batauha	2.9532	3.1427	-0.0256	0.1182	0.0969	0.1895
12	Mirzapur	Bedauli	1.7910	2.1625	0.2393	0.1036	0.0286	0.3715
13	Mirzapur	Bedauli Kalan	1.7509	1.9405	0.0798	0.0727	0.0371	0.1896
14	Mirzapur	Bhainsa	2.6360	3.1664	0.2349	0.1481	0.1474	0.5304
15	Mirzapur	Bhatewara	1.9933	2.5122	0.3531	0.1348	0.0310	0.5189
16	Mirzapur	Bhewar Karmanpur	2.3428	2.5164	0.0431	0.0978	0.0327	0.1736
17	Mirzapur	Bhogaon	2.1167	2.2912	0.0475	0.0865	0.0405	0.1745
18	Mirzapur	Bidapur	2.2064	2.2706	-0.0362	0.0762	0.0242	0.0642
19	Mirzapur	Bihari	1.2056	1.6624	0.3431	0.0909	0.0228	0.4568
20	Mirzapur	Birshahpur	1.5673	2.1468	0.4113	0.1226	0.0456	0.5795
21	Mirzapur	Bitthalpur	2.6794	2.2575	-0.5466	0.0097	0.1150	-0.4219
22	Mirzapur	Chakia	1.9981	2.3599	0.2161	0.1105	0.0352	0.3618
23	Mirzapur	Chapur Kalan	2.2906	2.4816	0.0634	0.0987	0.0289	0.1910
24	Mirzapur	Cheksari	4.6934	5.7375	0.6541	0.3337	0.0563	1.0441
25	Mirzapur	Cheruiram	1.5893	2.0253	0.3004	0.1037	0.0319	0.4360
26	Mirzapur	Chilh	2.0775	2.9885	0.6542	0.1936	0.0632	0.9110
27	Mirzapur	Chindlikh	2.1281	2.5021	0.2130	0.1169	0.0441	0.3740
28	Mirzapur	Chitakpur	2.7600	2.4441	-0.3883	0.0425	0.0299	-0.3159
29	Mirzapur	Dewariya Dilaman	2.0996	2.7428	0.4465	0.1574	0.0392	0.6432
30	Mirzapur	Dhanaita	1.8265	1.9887	0.0634	0.0738	0.0250	0.1622
31	Mirzapur	Dhani Patti	1.5209	2.0300	0.3271	0.1049	0.0771	0.5091
32	Mirzapur	Dharupur	2.1421	2.2377	0.0138	0.0818	0.0000	0.0956
33	Mirzapur	Dharuraha	2.3910	3.1392	0.5232	0.1868	0.0382	0.7482
34	Mirzapur	Dingurpatti	2.4203	3.8367	1.0958	0.2915	0.0291	1.4164
35	Mirzapur	Diyawn	2.4453	2.8960	0.2739	0.1449	0.0319	0.4507
36	Mirzapur	Domanpur	2.8608	2.7255	-0.2503	0.0728	0.0422	-0.1353
37	Mirzapur	Gagaut	1.9820	2.3068	0.1396	0.0958	0.0894	0.3248
38	Mirzapur	Garauli	4.2093	5.0309	0.4548	0.2719	0.0949	0.8216
39	Mirzapur	Gegraw	2.2791	2.4211	-0.0700	0.0740	0.1380	0.1420
40	Mirzapur	Gobraha	1.9200	2.1764	0.1164	0.0884	0.0516	0.2564
41	Mirzapur	Gorahi	2.4950	2.7306	0.0835	0.1133	0.0389	0.2356
42	Mirzapur	Gotwa	2.7614	2.7016	-0.1732	0.0813	0.0321	-0.0598
43	Mirzapur	Ishwarpatti	1.9810	2.0117	-0.0563	0.0606	0.0265	0.0307
44	Mirzapur	Jalalpur	2.2257	3.6385	1.0928	0.2805	0.0395	1.4128
45	Mirzapur	Jasowar	2.0622	2.2535	0.0569	0.0853	0.0492	0.1913
46	Mirzapur	Jiuti	1.7023	1.9883	0.1526	0.0832	0.0502	0.2860
47	Mirzapur	Kalyanpur	2.4489	2.6070	0.0152	0.0985	0.0444	0.1581
48	Mirzapur	Kamasin	1.7728	1.8525	-0.0089	0.0580	0.0306	0.0797
49	Mirzapur	Kanaksarai	2.4024	2.5473	0.0131	0.0956	0.0362	0.1449
50	Mirzapur	Karsara	1.9634	2.4365	0.3157	0.1265	0.0309	0.4731
51	Mirzapur	Kevtabeer	2.1041	2.4092	0.1636	0.1068	0.0347	0.3051
52	Mirzapur	Khaira	2.3018	1.9768	-0.4620	0.0047	0.1323	-0.3250
53	Mirzapur	Khajuri	1.4232	1.5956	0.0809	0.0553	0.0362	0.1724
54	Mirzapur	Kharhara	1.3030	2.0740	0.5982	0.1420	0.0308	0.7710
55	Mirzapur	Kholua	2.1761	3.0130	0.6161	0.1920	0.0287	0.8369
56	Mirzapur	Kholua Bhoj	1.9127	2.5727	0.4668	0.1510	0.0423	0.6600

Sr. No.	District	Scheme Name	Approved SLSSC Cost (Rs. In Cr.)	Proposed Revised Cost (Rs. In Cr.)	Variation due to increase (in Cr.)			
					Work Cost	GST	Power/N OC	Total
57	Mirzapur	Kirtartara	1.5053	2.1516	0.4859	0.1326	0.0278	0.6463
58	Mirzapur	Kolhar	1.7628	2.1159	0.2294	0.1003	0.0233	0.3531
59	Mirzapur	Kurkutiya Pandey	1.9154	1.8299	-0.1602	0.0383	0.0364	-0.0855
60	Mirzapur	Lacchapatti	1.6262	1.9269	0.1726	0.0828	0.0453	0.3007
61	Mirzapur	Lakhanpur	1.8040	2.4698	0.4579	0.1436	0.0643	0.6658
62	Mirzapur	Larbak	2.6694	2.4821	-0.2773	0.0577	0.0323	-0.1873
63	Mirzapur	Ledoo	2.0164	2.2499	0.0920	0.0892	0.0524	0.2335
64	Mirzapur	Magaraha	2.5330	2.3945	-0.2902	0.0480	0.1037	-0.1385
65	Mirzapur	Mahewa	1.6841	1.8921	0.0905	0.0711	0.0464	0.2080
66	Mirzapur	Majhgawan	2.0418	2.9882	0.7168	0.2029	0.0267	0.9464
67	Mirzapur	Maladharpura	1.6560	1.7869	0.0426	0.0609	0.0275	0.1309
68	Mirzapur	Mallepur	2.1174	2.9384	0.6070	0.1872	0.0267	0.8210
69	Mirzapur	Masari	1.9954	2.4152	0.2713	0.1203	0.0282	0.4198
70	Mirzapur	Mawaiya	2.3598	2.8809	0.2256	0.1316	0.1639	0.5211
71	Mirzapur	Meria	1.5368	1.8026	0.1567	0.0750	0.0341	0.2658
72	Mirzapur	Mitai	2.4315	2.8270	0.2185	0.1342	0.0428	0.3955
73	Mirzapur	Mulhawa	1.7642	1.9033	0.0313	0.0647	0.0431	0.1391
74	Mirzapur	Narayanpur	1.9139	2.0613	0.0342	0.0732	0.0400	0.1474
75	Mirzapur	Nauha	2.0102	2.3675	0.2137	0.1107	0.0329	0.3573
76	Mirzapur	Newadiya Ghat	1.8462	2.2374	0.2777	0.1135	0.0000	0.3912
77	Mirzapur	Newdhia	2.7004	5.1471	1.9310	0.4568	0.0590	2.4467
78	Mirzapur	Pahari	2.3241	2.5651	0.0986	0.1068	0.0356	0.2410
79	Mirzapur	Pakhwaiya	1.6653	2.1598	0.3513	0.1170	0.0262	0.4945
80	Mirzapur	Pasiyahi	2.7554	3.0510	0.1554	0.1402	0.0000	0.2956
81	Mirzapur	Pathra Dasaudhi	1.9970	2.1995	0.0771	0.0854	0.0400	0.2025
82	Mirzapur	Phulhan	1.8706	2.1253	0.1382	0.0897	0.0268	0.2547
83	Mirzapur	Purjagir	1.5580	2.3869	0.6292	0.1613	0.0384	0.8289
84	Mirzapur	Ramapur	2.1129	2.3925	0.1470	0.1042	0.0284	0.2796
85	Mirzapur	Sabesar	3.9187	4.2173	0.0615	0.1855	0.0516	0.2986
86	Mirzapur	Sarawan	2.1015	2.2507	0.0094	0.0788	0.0609	0.1492
87	Mirzapur	Saripatti	2.1281	2.6673	0.3685	0.1449	0.0259	0.5392
88	Mirzapur	Semar Belauha	1.4920	2.0668	0.4495	0.1253	0.0000	0.5748
89	Mirzapur	Semari	3.8579	3.2106	-0.7276	0.0403	0.0400	-0.6473
90	Mirzapur	Semra	2.1631	3.2292	0.8078	0.2258	0.0324	1.0661
91	Mirzapur	Shivrani	1.7022	1.8620	-0.0301	0.0503	0.1395	0.1598
92	Mirzapur	Shreepatti	3.9648	4.6560	0.4139	0.2514	0.0259	0.6912
93	Mirzapur	Sikhar	2.9424	2.3189	-0.6693	0.0017	0.0441	-0.6235
94	Mirzapur	Sinhar Kalan	1.9503	2.0593	0.0139	0.0715	0.0236	0.1090
95	Mirzapur	Sonbarsa	2.1370	2.2563	-0.0682	0.0667	0.1208	0.1193
96	Mirzapur	Sursi	1.5828	1.5154	-0.1200	0.0277	0.0249	-0.0674
97	Mirzapur	Tegrahi	1.9652	2.0129	-0.0383	0.0629	0.0231	0.0477
98	Mirzapur	Vijayapura	1.6316	2.2442	0.4440	0.1319	0.0367	0.6126
GRAND TOTAL			214.7712	248.4214	17.9287	11.2592	4.4623	33.6502

बैठक में उपरोक्तानुसार निर्णय लिये गये। तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(अनुराग श्रीवास्तव)
आई०ए०एस०

प्रमुख सचिव,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ०प्र० शासन/अध्यक्ष
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ-226010
संख्या-5196/डब्ल्यू-335/टेक/जे०जे०एम०/एस०एल०एस०एस०सी०-46वीं/2023-24
दिनांक 04 मार्च 2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. नामित प्रतिनिधि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग, उ०प्र०, 9वां तल इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ-226016।
7. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता (ग्रामीण) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
9. प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, बुन्देलखण्ड इन्स्टीट्यूट आफ इंजी.टेक्नोलाजी, झांसी।
10. प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
11. प्रोफेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, आई०आई०टी०, बी०एच०यू० वाराणसी।
12. प्रोफेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
13. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(बृजराज सिंह यादव)
आई०ए०एस०

अधिशासी निदेशक/
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

दिनांक 27.02.2024 को जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की छियालीसवीं बैठक में वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों/विशेषज्ञों की सूची

क्र०सं०	नाम	पदनाम	संस्था / विभाग
1	श्री अनुराग श्रीवास्तव आई०ए०एस०	प्रमुख सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
2	डा० बलकार सिंह आई०ए०एस०	प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3	श्री प्रदीप कुमार सिंह आई०ए०एस०	निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली-110003
4	श्री बृजराज सिंह यादव आई०ए०एस०	अधिशासी निदेशक	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5	श्री राजेश कुमार प्रजापति आई०ए०एस०	विशेष सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
6	श्री अबसार खॉन	इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ अभियन्ता राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
7	श्री सुमित प्रियदर्शी	सहायक सलाहकार राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

8	श्री जय मंगल राव	वित्त नियंत्रक	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9	श्री ए0पी0 सिंह	निदेशक	केन्द्रीय जल आयोग,अपर गंगा बेसिन जल नदी सदन, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
10	श्री रविकान्त सिंह	सीनियर जी0ओ0 हाइड्रोलोजिस्ट	भूगर्भ जल विभाग, नौवां तल इन्दिरा भवन अशोक मार्ग,लखनऊ।
11	श्री एस0जी0 भरतरिया	क्षेत्रीय निदेशक	केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, सीतापुर रोड, अलीगंज लखनऊ।
12	श्री इजहारूल हक फारुकी	प्रोफेसर एवं हेड	ए0एम0 यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
13	श्री आर0सी0 वैश्य	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
14	श्री गोविन्द पाण्डेय	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
15	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट,बुन्देलखण्ड इंस्टीट्यूट आफ इंज टेक्नोलॉजी, झांसी।
16	डा0 अम्बरीष कुमार सिंह	उप सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
17	श्री डी0के0 सिंह	मुख्य अभियंता (स्तर-2) / यूनिट कोऑर्डिनेटर(तकनीकी)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18	श्री गया प्रसाद	स्टेट कोऑर्डिनेटर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19	श्री आर0के0 शर्मा	मुख्य अभियंता (ग्रामीण)	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
20	श्रीमती रितिका राय	अधिकासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
21	श्रीमती ललिता सिंह	अधिकासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
